



*Municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán,
Del Departamento de Sololá
Guatemala C. A.*



Oficio No. 204-2026/MSCI/PTT/DMP/ste
02 de septiembre de 2026.

Lic. Carlos Antonio Mendoza Alvarado
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN, Guatemala, C. A.



Distinguido licenciado:

Respetuosamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus funciones administrativas.

La presente es para dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica del presupuesto con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permite verificar la calidad del gasto publico

El objetivo de hacer entrega el SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL, que corresponde del 1 de mayo al 31 de agosto del ejercicio fiscal 2026, de la municipalidad de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, en forma digital, para dar cumplimiento.

Agradeciendo la atención prestada a la presente aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

ATENTAMENTE.

Pascual Tambriz Tzep
Alcalde Municipal



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 2/09/2026 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					Total
Eje Katun:															
Guatemala Urbana y Rural															
Ordenamiento Territorial															
Proridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	85000	85000	0	Ejecución física	2420460.9	3435813.7	2917387.7	3341770.9	12115433.37	0	0%	0%	0%
		Meta financier	36670584.67	36670584.67		Ejecución fina						18293968.41	33.04%	49.89%	49.89%
353933-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COMON OJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1530	1530	0	Ejecución física		200	400	800	1400	1400	91.5%	91.5%	91.5%
		Meta financiera	899680.55	899680.55	0	Ejecución financiera	0	178815.36	0	0	178815.36	178815.36	19.88%	19.88%	19.88%
353941-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CALERA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física		200	400	400	1000	1000	95.24%	95.24%	95.24%
		Meta financiera	897976.75	897976.75	0	Ejecución financiera	0	179501.8	0	0	179501.8	179501.8	19.99%	19.99%	19.99%
361623-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR COZÁ, CASERIO SAN MIGUELITO, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2446.4	2446.4	0	Ejecución física		400	800	800	2000	2000	81.75%	81.75%	81.75%
		Meta financiera	1700004.35	1700004.35	0	Ejecución financiera	0	200000	0	309878.15	509878.15	509878.15	29.99%	29.99%	29.99%
361644-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PAQUISIC, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1646.5	1646.5	0	Ejecución física				300	300	300	18.22%	18.22%	18.22%
		Meta financiera	898449	898449	0	Ejecución financiera	0	0	0	179577	179577	179577	19.99%	19.99%	19.99%
361684-APOYO EQUIPO DE INVESTIGACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS 2.026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	30.66	121.66	243.66	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	215000	215000	0	Ejecución financiera	35712.5	35712.5	35712.5	35712.5	142850	215000	66.44%	66.44%	66.44%
361624-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XECUCHIN, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1560	1560	0	Ejecución física	500	500	255		1255	1560	80.45%	80.45%	80.45%
		Meta financiera	899348.7	899348.7	0	Ejecución financiera	300000	300000	119572.9	0	719572.9	899348.7	80.01%	80.01%	80.01%
367329-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUZ BE, CASERIO CHWACH ALAMNAX, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	804	804	0	Ejecución física				0	0	804	100%	100%	100%
		Meta financiera	512328.3	512328.3	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	512328.3	100%	100%	100%
354012-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física		100	300	300	700	700	58.33%	58.33%	58.33%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 2/09/2026 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
354012-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA	Metro cuadrado	Meta financiera	898436.75	898436.75	0	Ejecución financiera	0	177000	112187	0	289187	32.19%	32.19%	32.19%	32.19%
361638-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTORES DE CHWIBÉ Y XEBÉ, CASERIO CHIRUMAZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1199.5	1199.5	0	Ejecución física		200	500	499.5	1199.5	100%	100%	100%	100%
361638-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTORES DE CHWIBÉ Y XEBÉ, CASERIO CHIRUMAZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	898336.75	898336.75	0	Ejecución financiera	0	200000	400000	209287.2	809287.2	90.09%	90.09%	90.09%	90.09%
347663-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO NUEVO XETINAMIT, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	100%	0%	100%
361781-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO PASIN II, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1575	1575	0	Ejecución física	375	500	500	200	1575	100%	100%	100%	100%
367563-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LOLEMI, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	897276.25	897276.25	0	Ejecución financiera	197276.25	400000	200000	1	797277.25	88.86%	88.86%	88.86%	88.86%
367563-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LOLEMI, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	581	581	0	Ejecución física	281	300			581	100%	100%	100%	100%
348133-MEJORAMIENTO CALLE (CALLE JONES) CASERIO PACULAM, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	374585	374585	0	Ejecución financiera	174585	200000	0	0	374585	100%	100%	100%	100%
360557-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUGIGRONDINA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	100%	0%	100%
360557-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUGIGRONDINA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	898661.7	898661.7	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	898661.7	100%	100%	0%	100%
360557-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUGIGRONDINA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1504.1	1504.1	0	Ejecución física				300	300	19.95%	19.95%	19.95%	19.95%
361619-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES CHWONMASAQ Y ESCUELA, CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	3402.5	3402.5	0	Ejecución física	400	900	900	179925.62	179925.62	20%	20%	20%	20%
361619-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES CHWONMASAQ Y ESCUELA, CASERIO XEABAJ I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	1882676.6	1882676.6	0	Ejecución financiera	493887.57	500000	500000	200000	1693887.57	89.97%	89.97%	89.97%	89.97%
360555-CONSTRUCCION CAMINO RURAL APERTURA DE BRECHA DESDE EL CASERIO PASINA TZUCUBAL LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	100%	0%	100%
360555-CONSTRUCCION CAMINO RURAL APERTURA DE BRECHA DESDE EL CASERIO PASINA TZUCUBAL LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	899894.69	899894.69	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	899894.69	100%	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 2/09/2026 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
347906-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS CASERIOS (NUEVO CHAJUAB, NUEVO XOLJA Y PACORRAL II), SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	1	0 Ejecución física					0	0%	1	100%	0%
361843-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO TZAMUJUB, XECAQUIJCAN, NUEVO TZAMCHAJ, VISTA HERMOSA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2554	2554	2554	0 Ejecución física	1000	1000	454		2454	96.08%	2554	100%	96.08%
361843-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESTE Y CENTRO ALDEA CHIQUIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1468703.85	1468703.85	1468703.85	0 Ejecución financiera	450000	450000	275064.91	0	1175064.91	80.01%	1468703.85	100%	80.01%
361836-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN MIGUELITO, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	3002.5	3002.5	3002.5	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
361834-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO PASIS, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1411.1	1411.1	1411.1	0 Ejecución física	500	500	211.1		1211.1	85.83%	1411.1	100%	85.83%
367498-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA, CASERIO CUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	846	846	846	0 Ejecución física						0%	846	100%	0%
367088-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VISTA HERMOSA, ALDEA XEPIACUL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	577534.9	577534.9	577534.9	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	577534.9	100%	0%
354013-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PALOMOB, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	960	960	960	0 Ejecución física					0	0%	960	100%	0%
354008-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XOLJA, ALDEA	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	1800	0 Ejecución física		200	450	450	1100	61.11%	1100	61.11%	61.11%
		Meta financiera	899257.8	899257.8	899257.8	0 Ejecución financiera	0	0	179550	0	179550	19.97%	179550	19.97%	19.97%
		Meta física	1410	1410	1410	0 Ejecución física		200	400	500	1100	78.01%	1100	78.01%	78.01%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 2/09/2026 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
354006-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XOJOLÁ, ALDEA	Metro cuadrado	Meta financiera	898558.5	898558.5	0	Ejecución financiera	0	0	179628.68	0	179628.68	179628.68	19.99%	19.99%
353942-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NAHUALATE, CASERIO PANGUINEY, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1650	1650	0	Ejecución física		200	400	400	1000	1000	60.61%	60.61%
353935-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL CASERIO PACORRAL I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1650	1650	0	Ejecución física		0	302754.08	189000	491754.08	491754.08	32.49%	32.49%
353939-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA PRINCIPAL CASERIO TZAMABAJ, ALDEA CHUISANTO TOMÁS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1536	1536	0	Ejecución física		500	500	536	1536	1536	100%	100%
348394-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LOS BARRIOS: CHUIJUYUB Y PAXOCOL, ANTIGUA IXTAHUACAN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	1	100%	100%
361637-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA 2.026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física		60.83	60.83	60.83	243.32	243.32	66.66%	66.66%
348270-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO CHIRUXIMAY, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	14784.12	14784.12	14784.12	14784.13	59136.49	59136.49	14.78%	14.78%
361627-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHWASAQKIAQ, CASERIO TZAMJUYUB, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1520	1520	0	Ejecución física					1	1	100%	100%
361645-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XETINAMIT I, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1633.5	1633.5	0	Ejecución física					400	400	24.49%	24.49%
361625-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES IGLESIA CAN	Metro cuadrado	Meta física	1540	1540	0	Ejecución física					179638.8	179638.8	19.99%	19.99%
											0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 2/09/2026 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
361625-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTORES IGLESIA CANAAN Y GOMEZ, CASERIO CH	Metro cuadrado	Meta financiera	899403.45	899403.45	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
361625-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR GÓMEZ, CASERIO CHUJUIJ, ALDEA CAMACHE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	220	220	0	0	0	0	0	100	100	45.45%	100	45.45%	45.45%
373742-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PATZITE, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	275	275	0	0	0	0	0	100	100	36.36%	100	36.36%	36.36%
373770-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO CHUSAJCAVA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	297	297	0	0	0	0	0	100	100	33.67%	100	33.67%	33.67%
373721-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SANTA CRUZ, CASERIO PALILIC, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	292	292	0	0	0	0	0	125	125	42.81%	125	42.81%	42.81%
373672-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATÓLICA, CASERIO PASACUACH, ALDEA TZAMJUYUB, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	273	273	0	0	0	0	0	100	100	36.63%	100	36.63%	36.63%
373647-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO CHUICHO, ANTIGUA IXTAHUACAN, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	365	365	0	0	0	0	0	100	100	27.4%	100	27.4%	27.4%
373778-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA, CASERIO CHUICUILA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	276.5	276.5	0	0	0	0	0	100	100	36.17%	100	36.17%	36.17%
373778-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA, CASERIO CHUICUILA, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta física	276.5	276.5	0	0	0	0	0	100	100	36.17%	100	36.17%	36.17%

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avanza 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avanza Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avanza 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avanza Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12510167.39	12510167.39		0 Ejecución física	63	63	63	252	0%	504	0%	0%	0%
		Meta financiera			12510167.39	Ejecución fina	1212458.7	1212458.7	1212458.7	4849834.89	38.77%	8492481.43	67.88%	38.77%	67.88%
CONCEJO MUNICIPAL	Documento	Meta física	96	96	96	0 Ejecución física	8	8	8	32	33.33%	64	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1920480	1920480	1920480	0 Ejecución financiera	154945.5	154945.5	154945.5	619782	32.27%	1403833.84	73.1%	32.27%	73.1%
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Documento	Meta física	12	12	12	0 Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	810200	810200	810200	0 Ejecución financiera	52234.99	52234.99	52235	208939.97	25.79%	381161.93	47.05%	25.79%	47.05%
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	Documento	Meta física	96	96	96	0 Ejecución física	8	8	8	32	33.33%	64	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1025986.61	1025986.61	1025986.61	0 Ejecución financiera	148189.85	148189.85	148189.85	592759.4	57.77%	1025986.68	100%	57.77%	100%
ALCALDÍA MUNICIPAL	Documento	Meta física	12	12	12	0 Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	3383420.64	3383420.64	3383420.64	0 Ejecución financiera	406657.8	406657.8	406657.8	1626631.2	48.08%	2059858.38	60.88%	48.08%	60.88%
OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE	Documento	Meta física	12	12	12	0 Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	107529	107529	107529	0 Ejecución financiera	5776.97	5776.97	5776.97	23107.88	21.49%	63777.78	59.31%	21.49%	59.31%
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	Documento	Meta física	12	12	12	0 Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	191280	191280	191280	0 Ejecución financiera	16856.38	16856.38	16856.38	67425.52	35.25%	135101.04	70.63%	35.25%	70.63%
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	Documento	Meta física	108	108	108	0 Ejecución física	9	9	9	36	33.33%	72	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1443821	1443821	1443821	0 Ejecución financiera	93599.75	93599.75	93599.75	374399	25.93%	748592.07	51.85%	25.93%	51.85%
POLICIA MUNICIPAL	Documento	Meta física	180	180	180	0 Ejecución física	15	15	15	60	33.33%	120	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1183350	1183350	1183350	0 Ejecución financiera	128476.9	128476.9	128476.9	513907.6	43.43%	964745.2	81.53%	43.43%	81.53%
OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	Documento	Meta física	12	12	12	0 Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 2/09/2026 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
OFICINA MUNICIPAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA	Documento	Meta financiera	59456	59456	0	Ejecución financiera	5776.97	5776.97	5776.97	5776.97	38.87%	46277.78	77.84%	38.87%	77.84%
	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
APOYO INSTITUCIONAL A TRAVEZ DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Documento	Meta financiera	958440	958440	0	Ejecución financiera	72877.77	72877.77	72877.77	72877.77	30.42%	631501.79	65.89%	30.42%	65.89%
	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	Documento	Meta financiera	97560	97560	0	Ejecución financiera	10679.45	10679.45	10679.45	10679.45	43.79%	71734.72	73.53%	43.79%	73.53%
	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER 2025	Documento	Meta financiera	153122.14	153122.14	0	Ejecución financiera	12074.44	12074.44	12074.44	12074.44	31.54%	85235.16	55.66%	31.54%	55.66%
	Documento	Meta física	180	180	0	Ejecución física	15	15	15	15	33.33%	120	66.67%	33.33%	66.67%
SECRETARIA MUNICIPAL Y SECRETARIOS AUXILIARES	Documento	Meta financiera	1175522	1175522	0	Ejecución financiera	104311.95	104311.95	104311.95	104311.95	35.49%	874675.16	74.41%	35.49%	74.41%
	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Educación															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Estudiantes del nivel primario bilingües atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	4701247.96	4701247.96	0	Ejecución física	64291.88	64291.88	244162.32	64291.88	9.3%	1872853.28	39.84%	9.3%	39.84%
	Persona	Meta financiera	4701247.96	4701247.96	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
353468-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO CHAJUAB, ALDEA CHIKUISIS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	296070.25	296070.25	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	1	100%	0%	100%
	Metro cuadrado	Meta financiera	296070.25	296070.25	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
353416-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XECALBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	44745.44	44745.44	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	1	100%	0%	100%
	Metro cuadrado	Meta financiera	44745.44	44745.44	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
353444-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUAXAJIL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	56053.31	56053.31	1	Ejecución física	0	0	0	0	0%	1	100%	0%	100%
	Metro cuadrado	Meta financiera	56053.31	56053.31	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
361648-APOYO A LA EDUCACION 2026, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365	365	0	Ejecución física	30	31	30	30.66	33.33%	242.66	66.48%	33.33%	66.48%
	Dia	Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	64291.88	64291.88	64291.88	64291.88	36.74%	298314.53	42.62%	36.74%	42.62%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN**

Fecha y Hora: 2/09/2026 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
353467-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACHINUP I, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	686272.5	1	0 Ejecución física				0	0	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	686272.5	686272.5	0 Ejecución financiera	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	696272.5	100%	0%	100%
353384-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO XOLÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1	301528.81	1	0 Ejecución física				0	0	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	301528.81	301528.81	0 Ejecución financiera	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	301528.81	100%	0%	100%
372327-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	555.1	555.1	1 Ejecución física	1 Ejecución física				0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	897808.75	897808.75	1 Ejecución financiera	1 Ejecución financiera				0	0	0	0%	0%	0%
372328-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	425	425	1 Ejecución física	1 Ejecución física		25	150	175	41.18%	175	41.18%	41.18%	41.18%
		Meta financiera	899794.5	899794.5	1 Ejecución financiera	1 Ejecución financiera	0	0	179870.44	0	179870.44	179870.44	19.99%	19.99%	19.99%
374358-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PANIMAQUIM, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	192.1	192.1	0 Ejecución física	0 Ejecución física				0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	808976.4	808976.4	0 Ejecución financiera	0 Ejecución financiera				0	0	0	0%	0%	0%
Recursos naturales hoy y para el futuro															
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	15816877.29	15816877.29	365	0 Ejecución físic	321223.41	910252.91	2186410.1	11252.94		0	0%	0%	0%
		Meta financier			15816877.29	Ejecución fina						4641639.11	29.35%	21.68%	29.35%
354432-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Kilometro	Meta física	10.2	10.2	10.2	0 Ejecución física			0.8	2	2.8	2.8	27.45%	27.45%	27.45%
		Meta financiera	6020093.75	6020093.75	6020093.75	0 Ejecución financiera	0	0	1043267.6	0	1043267.6	1043267.6	17.33%	17.33%	17.33%
348406-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEABAJ II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta física	58.6	58.6	58.6	0 Ejecución física					0	58.6	100%	0%	100%
		Meta financiera	301890	301890	301890	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	301890	100%	0%	100%
361893-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.026, EN EL MUNICIPIO DE, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Día	Meta física	365	365	365	0 Ejecución física	30	31	30	30.66	121.66	243.66	66.76%	33.33%	66.76%
		Meta financiera	400000	400000	400000	0 Ejecución financiera	11252.91	11252.91	11252.91	11252.94	45011.67	289073.84	67.27%	11.25%	67.27%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2026



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 2/09/2026 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				% Avance Zdo. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Zdo. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto				
330920-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUDOLORES, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta fisica	1	1	1	0 Ejecución física					0	1	100%	0%
		Meta financiera	384657.52	384657.52	0 Ejecución financiera	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	384657.52	100%	0%
345062-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACUTAMÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta fisica	53.83	53.83	0 Ejecución física	0 Ejecución física	0.03				0.03	53.83	100%	0.06%
		Meta financiera	610802.5	610802.5	0 Ejecución financiera	0 Ejecución financiera	308912.5	0	0	0	308912.5	610802.5	100%	50.57%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Unidad	Meta fisica	813	813	0 Ejecución física	0 Ejecución física		813			813	813	100%	100%
		Meta financiera	899000	899000	0 Ejecución financiera	0 Ejecución financiera	0	899000	0	0	899000	899000	100%	100%
354007-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PACANAL II, ALDEA CHUISANTO TOMÁS, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Kilometro	Meta fisica	5.09	5.09	0 Ejecución física	0 Ejecución física			0.3	1	1.3	1.3	25.54%	25.54%
		Meta financiera	1972703.62	1972703.62	0 Ejecución financiera	0 Ejecución financiera	0	0	394285.45	0	394285.45	394285.45	19.99%	19.99%
354010-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TZAMJUUP, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Kilometro	Meta fisica	4.58	4.58	0 Ejecución física	0 Ejecución física			0.2	1	1.2	1.2	26.2%	26.2%
		Meta financiera	3345167.9	3345167.9	0 Ejecución financiera	0 Ejecución financiera	0	0	737604.2	0	737604.2	737604.2	22.05%	22.05%
331090-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO PACORRAL II, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro lineal	Meta fisica	1	1	0 Ejecución física	0 Ejecución física					0	1	100%	0%
		Meta financiera	1058	1058	0 Ejecución financiera	0 Ejecución financiera	1058	0	0	0	1058	1058	100%	100%
375986-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS PALMAS, ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro	Meta fisica	4680	4680	0 Ejecución física	0 Ejecución física					0	0	0%	0%
		Meta financiera	1881504	1881504	0 Ejecución financiera	0 Ejecución financiera					0	0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2026



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 2/09/2026 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física			365	0 Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	200000		200000	Ejecución fina	0	11500	0	0	11500	5.75%	11500	5.75%	5.75%
361927-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2.026. SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365		365	0 Ejecución física		121.66			121.66	33.33%	121.66	33.33%	33.33%
		Meta financiera	200000		200000	0 Ejecución financiera	0	11500	0	0	11500	5.75%	11500	5.75%	5.75%
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de los recursos naturales															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física			365	0 Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	18369421.52		18369421.52	Ejecución fina	323618.32	32116.37	32116.37	1924307.5	2312158.62	12.59%	5426154.85	29.54%	29.54%
354427-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA TZUCUBAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	152.3		152.3	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	899673.8		899673.8	0 Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
CONSTRUCCION EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	2176		2176	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	6000000		6000000	0 Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%
348701-CONSTRUCCION SALON DE USOS MÚLTIPLES CASERIO CHIRUMAZÁ, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1		1	0 Ejecución física					0	0%	1	100%	100%
		Meta financiera	2026332.37		2026332.37	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	2026332.37	0%	2026332.37	100%	100%
361847-CONSERVACION EDIFICIO E INSTALACIONES CABECERA, ALDEAS Y SUS CASERIOS 2.026; DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365		365	0 Ejecución física	30	31	30	30.66	121.66	33.33%	242.66	66.48%	66.48%
		Meta financiera	300000		300000	0 Ejecución financiera	32116.37	32116.37	32116.37	32116.38	128465.49	42.82%	163454.35	54.48%	54.48%
333151-REPOSICION CENTRO DE SALUD ALDEA LA CEIBA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1300		1300	0 Ejecución física				400	400	30.77%	400	30.77%	30.77%
		Meta financiera	6000000		6000000	0 Ejecución financiera	0	0	0	1667079.28	1667079.28	27.78%	1667079.28	27.78%	27.78%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Segundo Cuatrimestre 2026



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

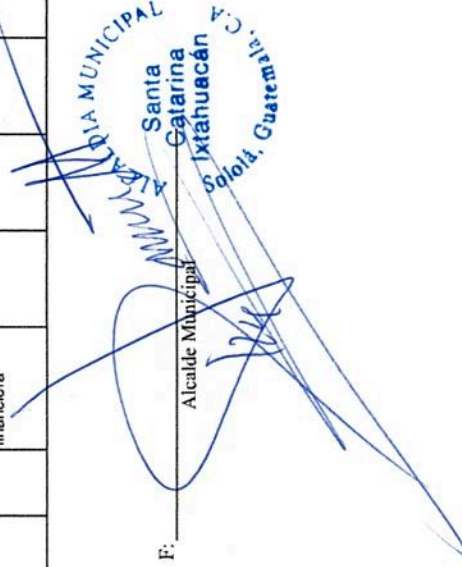
Fecha y Hora: 2/09/2026 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
3328339-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	1	1	1	0 Ejecución física	291501.95	0	0	0	291501.95	0%	1	100%	100%
3544330-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CHUISAMAYAC, ALDEA TZAMPOJ, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	152.3	152.3	152.3	0 Ejecución física	0	0	0	50	50	32.83%	50	32.83%	32.83%
348841-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CASERIO PACUT, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	702675	702675	702675	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1	100%	100%
354444-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CHUISIBEL, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta fisica	152.3	152.3	152.3	0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	899595.8	899595.8	899595.8	0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Población en condición de vulnerabilidad atendida	Persona	Meta fisica				0 Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	300000	300000	300000	Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
361790-APOYO ESTRATEGIA EMERGENCIA Y CALAMIDAD 2.026. SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta fisica	365	365	365	0 Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	300000	0 Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN

Fecha y Hora: 2/09/2026 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre				Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto					
Eje Katun:	Recursos naturales hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de los recursos naturales														
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país														
Promoción de proyectos de Generación de energías renovables	Hogares	Meta física	1150000	1150000	365	0	Ejecución física					0	0%	0%	0%
		Meta financiera			1150000	Ejecución fina	0	0	0	0	433657.42	37.71%	0%	37.71%	
361621-APOYO SERVICIOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2.026, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA	Dia	Meta física	365	365	365	0	Ejecución física					0	0%	33.15%	0%
		Meta financiera	1150000	1150000	1150000	Ejecución financiera	0	0	0	0	433657.42	37.71%	0%	37.71%	

F: 

Alcalde Municipal

Alcaldía Municipal Santa Catarina Ixtahuacán Sololá, Guatemala
